


Sprint Backlog 3

- **Objectif du Sprint (Sprint Goal)** : Implémenter l'IA via Gemini, finaliser la gestion Admin et déployer l'application sous Docker.
- **Durée du Sprint** : 14 jours.
- **Capacité du Sprint** : 43 Story Points.
- **Scrum Master** : Hameza Mohamed Aziz.
- **Équipe de Développement** : 3 membres (Hameza Mohamed Aziz, Balti Eya, et Hachana Wajdi).

Sprint 3 Burndown Chart :

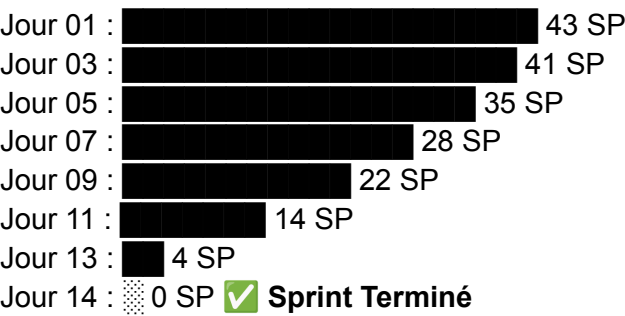

Rétrospective du Sprint 3 :

Catégorie	Ce qui s'est bien passé (Points Positifs)	Ce qui pourrait être amélioré (Points Faibles)	Actions à entreprendre (Action Items)
Travail d'Équipe	Forte autonomie des membres sur leurs modules respectifs (IA, Admin, Dashboards).	Surcharge de travail pour Aziz sur la partie Dockerisation et IA en fin de sprint.	Mieux équilibrer les tâches de déploiement entre les membres lors de futures releases.
Conception Technique	L'intégration de l'API Gemini apporte une réelle valeur ajoutée au produit.	Difficultés techniques lors de la création des Dockerfiles multi-stage pour React.	Créer des templates Docker réutilisables pour simplifier les prochains projets.

Gestion du Flux	Livraison de toutes les US prévues dans les temps pour la démo finale.	Le déploiement CI/CD a été finalisé à la toute fin du sprint.	Prévoir une phase de "Freeze" du code 48h avant la fin pour se concentrer uniquement sur le déploiement.
------------------------	--	---	--
